



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

Proyek / Project : Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
 Langganan / Client : PT Elsewedy Electric Indonesia
 Lokasi / Location : GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT

1. Lokasi Kerja / Work Location : Area Transformer GI 150 kV KTT Data Center Cikarang
2. Tanggal / Date : 05 Maret 2024
3. Pengawas Pekerjaan / Site Coordinator : Erus Rustandi Sidik
4. Jumlah Pekerja / Number of Manpower : 5 Orang / Person

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Mulai / Start	Selesai / Finish
1	Erus Rustandi Sidik	Site Coordinator	08:00	16.00
2	Egi Sehabudin	Safety Officer	08:00	16.00
3	Roni Hardiana	Technician	08:00	16.00
4	Nana Sumpena	Technician	08:00	16.00
5	Abdul Rahman Tanjung	Operator Crane	08:00	16.00

5. Peralatan Kerja / Equipment / Tools

No	Uraian / Description	Jml/ Qty
1	Mobile Crane 9 Ton	1 Unit

6. Pekerjaan Yang Dilakukan / Activities Has Been Done :

- Mobilisasi Tools and Equipment
- Loading Aksesoris

7. Rencana Pekerjaan Besok / Tomorrow Activities Plan :

- Penempatan Tools and Equipment
- Loading Aksesoris
- Dispacking Aksesoris
- Pemasangan Radiator

8. Kejadian Penting / Important Event : N/A**9. Cuaca / Weather :**

06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00
		V	V	V	V	V	V	X	X	X						

V = Cerah / Bright

C = Mendung

X = Hujan / Rain or drizzle

10. Pelaporan Insident / EHS Issue : N/A**Dibuat Oleh / Prepared by**


(.....ERUS.....R.....)

Disetujui Oleh / Approved by


(.....RONI.....HARDIANA.....)

Diketahui Oleh / Knownledged by

(.....)



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project

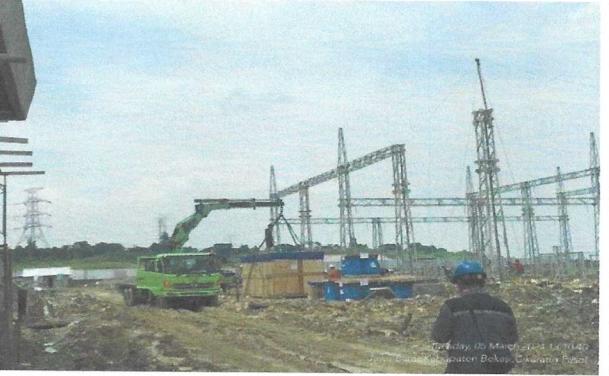
Langganan / Client

Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

- : Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
- : PT Elsewedy Electric Indonesia
- : GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

FOTO LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT PHOTOS

 GI KTT Data Center 05/03/2024 13:11	 GI KTT Data Center 05/03/2024 12:41
Loading Aksesoris 	Loading Aksesoris 
Loading Aksesoris 	Loading Aksesoris 
Loading Aksesoris	Loading Aksesoris



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT

1. Lokasi Kerja / Work Location : Area Transformer GI 150 kV KTT Data Center Cikarang
2. Tanggal / Date : 06 Maret 2024
3. Pengawas Pekerjaan / Site Coordinator : Erus Rustandi Sidik
4. Jumlah Pekerja / Number of Manpower : 5 Orang / Person

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Mulai / Start	Selesai / Finish
1	Erus Rustandi Sidik	Site Coordinator	08:00	18.00
2	Egi Sehabudin	Safety Officer	08:00	18.00
3	Roni Hardiana	Technician	08:00	18.00
4	Rodi Robiansyah	Technician	08:00	18.00
5	Abdul Rahman Tanjung	Operator Crane	08:00	18.00

5. Peralatan Kerja / Equipment / Tools

No	Uraian / Description	Jml/ Qty
1	Mobile Crane 9 Ton	1 Unit

6. Pekerjaan Yang Dilakukan / Activities Has Been Done :

- Loading Aksesories
- Penempatan Tools and Equipment

7. Rencana Pekerjaan Besok / Tomorrow Activities Plan :

- Dispacking Aksesoris
- Pemasangan Radiator
- Pemasangan Conservator

8. Kejadian Penting / Important Event : N/A

9. Cuaca / Weather :

06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00
		V	V	V	V	V	V	V	X	X	C	C				

V = Cerah / Bright

C = Mendung

X = Hujan / Rain or drizzle

10. Pelaporan Insident / EHS Issue : N/A

Dibuat Oleh / Prepared by


 (.....ERUS - R.....)

Disetujui Oleh / Approved by


 (.....Roni Hardiana.....)

Diketahui Oleh / Knownedged by

(.....)



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project

Langganan / Client

Lokasi / Location

ELSEWEDY

ELECTRIC

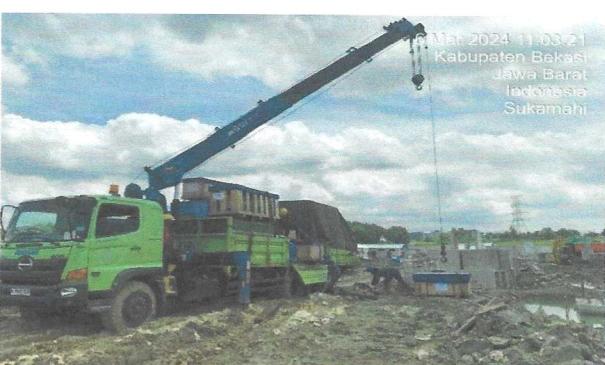
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA

: PT Elsewedy Electric Indonesia

: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

FOTO LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT PHOTOS

	
<p>Loading Aksesoris</p>	<p>Loading Aksesoris</p>
	
<p>GI KTT Data Center 06/03/2024 10:52</p>	<p>6 Mar 2024 10:30:26 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia Sukamahi</p>
<p>Loading Aksesoris</p>	<p>Loading Aksesoris</p>
	
<p>6 Mar 2024 10:27:22 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia Sukamahi</p>	<p>6 Mar 2024 11:03:21 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia Sukamahi</p>
<p>Loading Aksesoris</p>	<p>Loading Aksesoris</p>



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project

Langganan / Client

Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang



Loading Aksesoris

Loading Aksesoris



Penempatan Tools and Equipment

Penempatan Tools and Equipment



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

Proyek / Project : Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
 Langganan / Client : PT Elsewedy Electric Indonesia
 Lokasi / Location : GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT

1. Lokasi Kerja / Work Location : Area Transformer GI 150 kV KTT Data Center Cikarang
2. Tanggal / Date : 07 Maret 2024
3. Pengawas Pekerjaan / Site Coordinator : Erus Rustandi Sidik
4. Jumlah Pekerja / Number of Manpower : 5 Orang / Person

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Mulai / Start	Selesai / Finish
1	Erus Rustandi Sidik	Site Coordinator	08:00	16.00
2	Egi Sehabudin	Safety Officer	08:00	16.00
3	Roni Hardiana	Technician	08:00	16.00
4	Gilang Maulana Sidik	Tester	08:00	16.00
5	Abdul Rahman Tanjung	Operator Crane	08:00	16.00

5. Peralatan Kerja / Equipment / Tools

No	Uraian / Description	Jml/ Qty
1	Mobile Crane 9 Ton	1 Unit
2	Tools	1 Box

6. Pekerjaan Yang Dilakukan / Activities Has Been Done :

- Insulation Test Core - Frame - Ground
- Dispacking Aksesoris
- Pemasangan Radiator
- Inspeksi Rubber Bag Conservator
- Pemasangan Support Conservator
- Pemasangan Conservator

7. Rencana Pekerjaan Besok / Tomorrow Activities Plan :

- Pemasangan HV Turret
- Pemasangan HV Bushing
- Pemasangan LV Bushing
- Drain Oli Maintank
- Pemasangan Pipa-Pipa


8. Kejadian Penting / Important Event : N/A**9. Cuaca / Weather :**

06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00
		V	V	V	V	V	C	C	C	C						

V = Cerah / Bright

C = Mendung

X = Hujan / Rain or drizzle

10. Pelaporan Insident / EHS Issue : N/A**Dibuat Oleh / Prepared by**


(ERUS RUSTANDI SIDIK)

Disetujui Oleh / Approved by


(RONI HARDIANA)

Diketahui Oleh / Knownedged by

(.....)



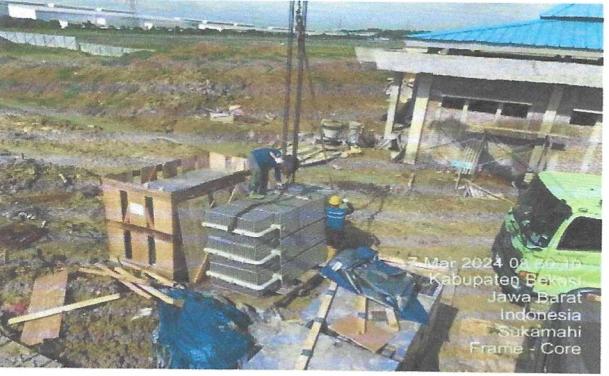
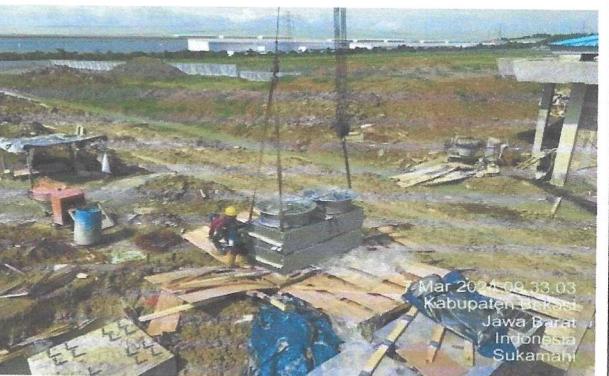
PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

FOTO LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT PHOTOS

	
Safety Briefing	Safety Briefing
	
Insulation Test Core – Frame – Ground	Insulation Test Core – Frame – Ground
	
Dispacking Aksesoris	Dispacking Aksesoris

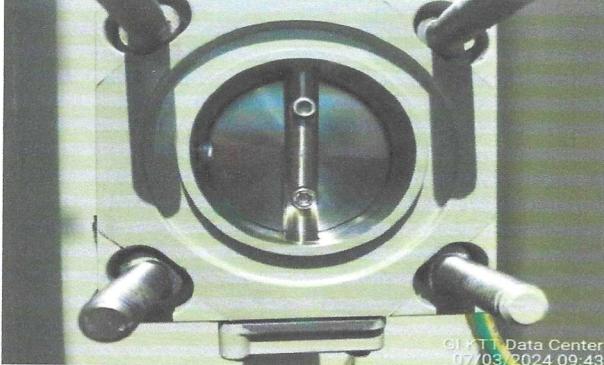
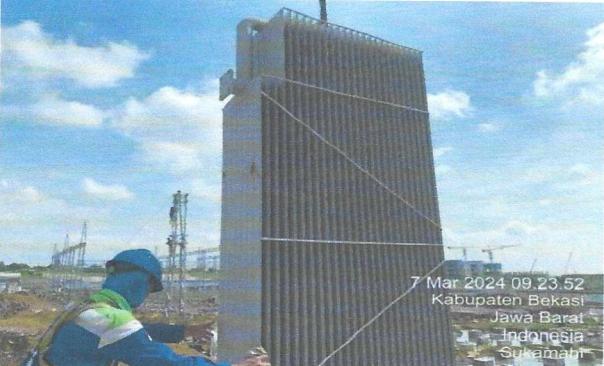


PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

 GI KTT Data Center 07/03/2024 09:43	 GI KTT Data Center 07/03/2024 09:43
Pemasangan Radiator	Pemasangan Radiator
 7 Mar 2024 09:23:52 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia Sukamahi	 GI KTT Data Center 07/03/2024 09:37
Pemasangan Radiator	Pemasangan Radiator
 GI KTT Data Center 07/03/2024 11:05	 GI KTT Data Center 07/03/2024 11:06
Inspeksi Rubber Bag Conservator	Inspeksi Rubber Bag Conservator



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang



Pemasangan Support Conservator

Pemasangan Support Conservator



Pemasangan Conservator

Pemasangan Conservator



Pemasangan Conservator

Pemasangan Conservator



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT

1. Lokasi Kerja / Work Location : Area Transformer GI 150 kV KTT Data Center Cikarang
2. Tanggal / Date : 08 Maret 2024
3. Pengawas Pekerjaan / Site Coordinator : Erus Rustandi Sidik
4. Jumlah Pekerja / Number of Manpower : 5 Orang / Person

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Mulai / Start	Selesai / Finish
1	Erus Rustandi Sidik	Site Coordinator	08:00	17.00
2	Egi Sehabudin	Safety Officer	08:00	17.00
3	Roni Hardiana	Technician	08:00	17.00
4	Gilang Maulana Sidik	Tester	08:00	17.00
5	Abdul Rahman Tanjung	Operator Crane	08:00	17.00
6	Dudung Gunawan	Technician	08:00	17.00
7	Nana Sumpena	Technician	08:00	17.00
8	Rodi Robiansyah	Technician	08:00	17.00

5. Peralatan Kerja / Equipment / Tools

No	Uraian / Description	Jml/ Qty
1	Mobile Crane 9 Ton	1 Unit
2	Tools	1 Box

6. Pekerjaan Yang Dilakukan / Activities Has Been Done :

- Pemasangan HV Turret
- Pemasangan HV Bushing
- Pemasangan LV Bushing
- Pemasangan Bucholz
- Pemasangan Pipa-Pipa

7. Rencana Pekerjaan Besok / Tomorrow Activities Plan :

- Drain Oli Maintank
- Koneksi HV & HVN Bushing
- Proses Vacuum
- Filling Oli dari Drum Ke Storage Tank
- Purifikasi Oli di Storage Tank
- Pemasangan FAN

8. Kejadian Penting / Important Event : N/A**9. Cuaca / Weather :**

06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00
		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

V = Cerah / Bright

C = Mendung

X = Hujan / Rain or drizzle

10. Pelaporan Insident / EHS Issue : N/A**Dibuat Oleh / Prepared by**


(.....ERUS R.....)

Disetujui Oleh / Approved by


(.....YOGI SUGIHARTO.....)

Diketahui Oleh / Knownedged by

(.....)



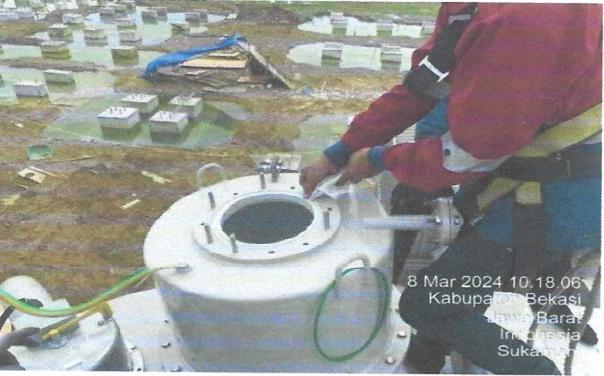
PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

FOTO LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT PHOTOS

 GI KTT Data Center 08/03/2024 08:54	 GI KTT Data Center 08/03/2024 08:53
Safety Briefing	Safety Briefing
 8 Mar 2024 10.00.22 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia Sukamahi	 8 Mar 2024 09.41.28 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia Sukamahi
Pemasangan HV Turret	Pemasangan HV Turret
 8 Mar 2024 10.18.06 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia Sukamahi	 8 Mar 2024 10.37.07 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia Sukamahi
Pemasangan HV Bushing	Pemasangan HV Bushing



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project

Langganan / Client

Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

- Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
- PT Elsewedy Electric Indonesia
- GI 150 kV KTT Data Center Cikarang



Pemasangan HV Bushing



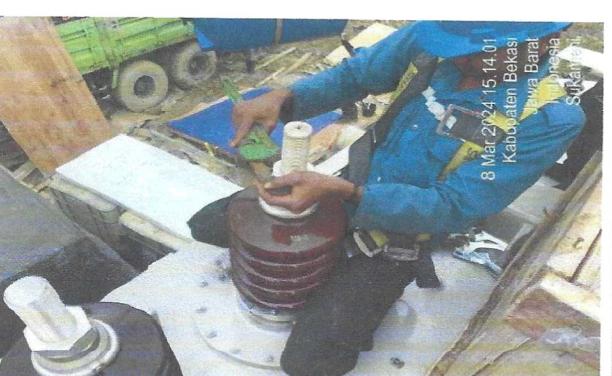
Pemasangan HV Bushing



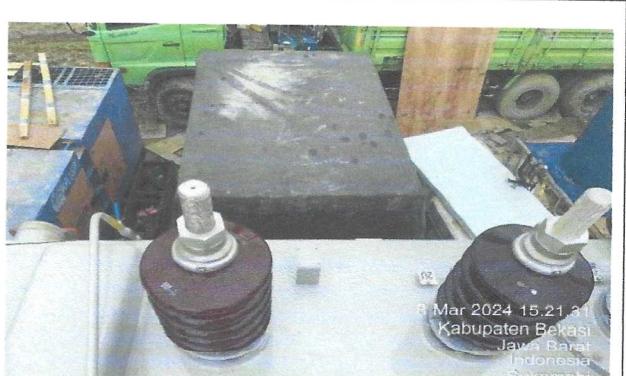
Pemasangan HV Bushing



Pemasangan HV Bushing



Pemasangan LV Bushing



Pemasangan LV Bushing

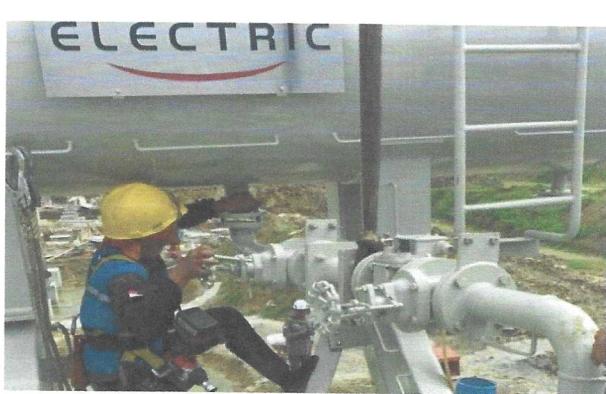


PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang



Pemasangan Bucholz



Pemasangan Bucholz



GI KTT Data Center
08/03/2024 15:06



Pemasangan Pipa-Pipa



8 Mar 2024 17.00.12
Kabupaten Bekasi
Jawa Barat
Indonesia
Sukamahi



Pemasangan Pipa-Pipa

Pemasangan Pipa-Pipa



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project : Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
 Langganan / Client : PT Elsewedy Electric Indonesia
 Lokasi / Location : GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT

1. Lokasi Kerja / Work Location : Area Transformer GI 150 kV KTT Data Center Cikarang
2. Tanggal / Date : 09 Maret 2024
3. Pengawas Pekerjaan / Site Coordinator : Erus Rustandi Sidik
4. Jumlah Pekerja / Number of Manpower : 9 Orang / Person

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Mulai / Start	Selesai / Finish
1	Erus Rustandi Sidik	Site Coordinator	08:00	16.00
2	Egi Sehabudin	Safety Officer	08:00	07.00
3	Roni Hardiana	Technician	08:00	16.00
4	Gilang Maulana Sidik	Tester	08:00	16.00
5	Abdul Rahman Tanjung	Operator Crane	08:00	16.00
6	Dudung Gunawan	Technician	08:00	07.00
7	Nana Sumpena	Technician	08:00	07.00
8	Rodi Robiansyah	Technician	08:00	07.00
9	Unang Muhsin	Technician	08:00	16.00

5. Peralatan Kerja / Equipment / Tools

No	Uraian / Description	Jml/ Qty
1	Mobile Crane 9 Ton	1 Unit
2	Tools	1 Box
3	Mesin Vacuum	1 Unit
4	Mesin Purifikasi	1 Unit
5	Genset	1 Unit

6. Pekerjaan Yang Dilakukan / Activities Has Been Done :

- Drain Oli Maintank
- Koneksi HV & HVN Bushing
- Wiring FAN
- Proses Vacuum
- Filling & Purifikasi Oli di Storage Tank
- Filling & Purifikasi Oli di Maintank

7. Rencana Pekerjaan Besok / Tomorrow Activities Plan :

- Purifikasi Oli di Maintank
- Pemasangan FAN
- Cleaning Trafo dan Area Trafo

8. Kejadian Penting / Important Event : N/A**9. Cuaca / Weather :**

06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00
		V	V	V	V	V	C	C	V	V	V	V	V	V	V	V

V = Cerah / Bright

C = Mendung

X = Hujan / Rain or drizzle

10. Pelaporan Insident / EHS Issue : N/A**Dibuat Oleh / Prepared by**

(..... Erus)

Disetujui Oleh / Approved by

(..... Yogi Gunyan

Diketahui Oleh / Knownledged by

(.....)



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

FOTO LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT PHOTOS



Safety Briefing

Safety Briefing



Koneksi HV & HVN Bushing

Koneksi HV & HVN Bushing



Wiring FAN

Wiring FAN



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

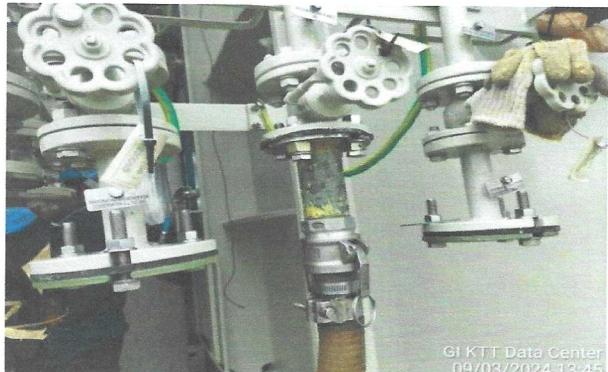
Proyek / Project

Langganan / Client

Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang



Proses Vacuum

Proses Vacuum



Filling & Purifikasi Oli di Storage Tank

Filling & Purifikasi Oli di Storage Tank



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT

1. Lokasi Kerja / Work Location : Area Transformer GI 150 kV KTT Data Center Cikarang
2. Tanggal / Date : 10 Maret 2024
3. Pengawas Pekerjaan / Site Coordinator : Erus Rustandi Sidik
4. Jumlah Pekerja / Number of Manpower : 8 Orang / Person

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Mulai / Start	Selesai / Finish
1	Erus Rustandi Sidik	Site Coordinator	08:00	16.00
2	Egi Sehabudin	Safety Officer	08:00	16.00
3	Roni Hardiana	Technician	08:00	16.00
4	Gilang Maulana Sidik	Tester	08:00	16.00
5	Dudung Gunawan	Technician	08:00	16.00
6	Nana Sumpena	Technician	08:00	16.00
7	Rodi Robiansyah	Technician	08:00	16.00
8	Unang Muhsin	Technician	08:00	16.00

5. Peralatan Kerja / Equipment / Tools

No	Uraian / Description	Jml/ Qty
1	Tools	1 Box
2	Mesin Vacuum	1 Unit
3	Mesin Purifikasi	1 Unit
4	Genset	1 Unit

6. Pekerjaan Yang Dilakukan / Activities Has Been Done :

- Purifikasi Oli di Maintank
- Wiring FAN
- Venting Trafo
- Cleaning Trafo dan Area Trafo

7. Rencana Pekerjaan Besok / Tomorrow Activities Plan :

- Site Test
- Pemasangan FAN
- Cleaning Trafo dan Area Trafo

8. Kejadian Penting / Important Event : N/A**9. Cuaca / Weather :**

06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00
		V	V	V	V	C	X	X	X	C						


V = Cerah / Bright

C = Mendung

X = Hujan / Rain or drizzle

10. Pelaporan Incident / EHS Issue : N/A

Dibuat Oleh / Prepared by



(.....ERUS.....)

Disetujui Oleh / Approved by



(.....YOGI SYURAIN.....)

Diketahui Oleh / Knownedged by

(.....)



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project

Langganan / Client

Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

- : Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
- : PT Elsewedy Electric Indonesia
- : GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

FOTO LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT PHOTOS

 <p>GI KTT Data Center 10/03/2024 08.58</p>	 <p>GI KTT Data Center 10/03/2024 08.58</p>
<p>Safety Briefing</p>	<p>Safety Briefing</p>
 <p>GI KTT Data Center 10/03/2024 10.09</p>	 <p>10 Mar 2024 14.24.27 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia</p>
<p>Purifikasi Oli di Maintank</p>	<p>PPM Purifikasi Oli di Maintank</p>
 <p>9 Mar 2024 11.37.55 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia Sukamaju Phase W</p>	 <p>9 Mar 2024 13.45.31 Kabupaten Bekasi Jawa Barat Indonesia Sukamaju Phase W</p>
<p>Wiring FAN</p>	<p>Wiring FAN</p>



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project

Langganan / Client

Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

- : Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
- : PT Elsewedy Electric Indonesia
- : GI 150 kV KTT Data Center Cikarang



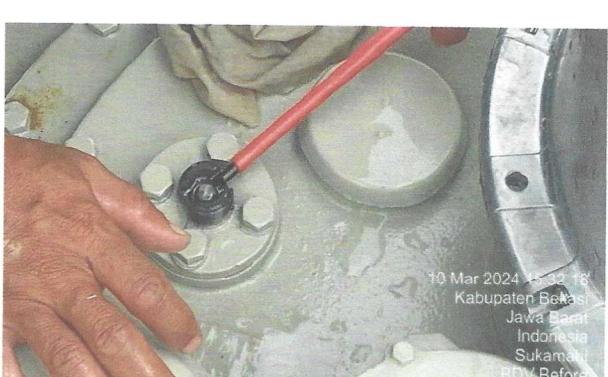
Venting Trafo



Venting Trafo



Venting Trafo



Venting Trafo



Cleaning Trafo dan Area Trafo



Cleaning Trafo dan Area Trafo



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

**LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT**

1. Lokasi Kerja / Work Location : Area Transformer GI 150 kV KTT Data Center Cikarang
2. Tanggal / Date : 11 Maret 2024
3. Pengawas Pekerjaan / Site Coordinator : Erus Rustandi Sidik
4. Jumlah Pekerja / Number of Manpower : 9 Orang / Person

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Mulai / Start	Selesai / Finish
1	Erus Rustandi Sidik	Site Coordinator	08:00	17.00
2	Egi Sehabudin	Safety Officer	08:00	17.00
3	Roni Hardiana	Technician	08:00	17.00
4	Gilang Maulana Sidik	Tester	08:00	17.00
5	Dudung Gunawan	Technician	08:00	17.00
6	Nana Sumpena	Technician	08:00	17.00
7	Rodi Robiansyah	Technician	08:00	17.00
8	Unang Muhsin	Technician	08:00	17.00
9	Abdul Rahman Tanjung	Technician	08:00	17.00

5. Peralatan Kerja / Equipment / Tools

No	Uraian / Description	Jml/ Qty
1	Tools	1 Box
2	Alat Test	6 Set
3	Genset	1 Unit

6. Pekerjaan Yang Dilakukan / Activities Has Been Done :

- Site Test
- Pemasangan & Wiring FAN

7. Rencana Pekerjaan Besok / Tomorrow Activities Plan :

- Site Test
- Cleaning Trafo dan Area Trafo

8. Kejadian Penting / Important Event : N/A**9. Cuaca / Weather :**

06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00
		X	X	X	C	C	X	X	X	X						

V = Cerah / Bright

C = Mendung

X = Hujan / Rain or drizzle

10. Pelaporan Insident / EHS Issue : N/A**Dibuat Oleh / Prepared by**


(.....ERUS - R.....)

Disetujui Oleh / Approved by


(.....RONI HARDIANA.....)

Diketahui Oleh / Knownledged by

(.....)



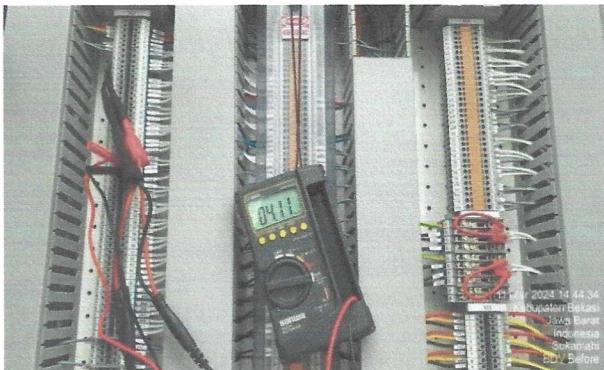
PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

FOTO LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT PHOTOS

	
<p>Site Test</p> 	<p>Site Test</p> 
<p>Site Test</p> 	<p>Site Test</p> 
<p>Pemasangan & Wiring FAN</p>	<p>Pemasangan & Wiring FAN</p>

11 Mar 2024 12:09:39
Kabupaten Bekasi
Jawa Barat
Indonesia
Sukamati
BDV Before

11 Mar 2024 14:44:34
Kabupaten Bekasi
Jawa Barat
Indonesia
Sukamati
BDV Before

11 Mar 2024 14:58:00
Kabupaten Bekasi
Jawa Barat
Indonesia
Sukamati
BDV Before

11 Mar 2024 15:39:00
Kabupaten Bekasi
Jawa Barat
Indonesia
Sukamati
BDV Before



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project
Langganan / Client
Lokasi / Location

ELSEWEDY
ELECTRIC
INDONESIA

: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
: PT Elsewedy Electric Indonesia
: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT

1. Lokasi Kerja / Work Location : Area Transformer GI 150 kV KTT Data Center Cikarang
2. Tanggal / Date : 12 Maret 2024
3. Pengawas Pekerjaan / Site Coordinator : Erus Rustandi Sidik
4. Jumlah Pekerja / Number of Manpower : 9 Orang / Person

No.	Nama / Name	Jabatan / Position	Mulai / Start	Selesai / Finish
1	Erus Rustandi Sidik	Site Coordinator	08:00	16.00
2	Egi Sehabudin	Safety Officer	08:00	16.00
3	Roni Hardiana	Technician	08:00	16.00
4	Gilang Maulana Sidik	Tester	08:00	16.00
5	Dudung Gunawan	Technician	08:00	16.00
6	Nana Sumpena	Technician	08:00	16.00
7	Rodi Robiansyah	Technician	08:00	16.00
8	Unang Muhsin	Technician	08:00	16.00
9	Abdul Rahman Tanjung	Technician	08:00	16.00

5. Peralatan Kerja / Equipment / Tools

No	Uraian / Description	Jml/ Qty
1	Tools	1 Box
2	Alat Test	6 Set
3	Genset	1 Unit

6. Pekerjaan Yang Dilakukan / Activities Has Been Done :

- Site Test
- Pengambilan Sampel Oli DGA
- Touch Up
- Cleaning Trafo dan Area Trafo

7. Rencana Pekerjaan Besok / Tomorrow Activities Plan :

-

-

8. Kejadian Penting / Important Event : N/A**9. Cuaca / Weather :**

06.00	07.00	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00	21.00	22.00
		V	V	C	V	V	V									

V = Cerah / Bright

C = Mendung

X = Hujan / Rain or drizzle

10. Pelaporan Insident / EHS Issue : N/A**Dibuat Oleh / Prepared by**


(.....
ERUS - 12.....)

Disetujui Oleh / Approved by


(.....
YOGI SURYAN.....)

Diketahui Oleh / Knownledged by

(.....)



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project

Langganan / Client

Lokasi / Location



INDONESIA

- Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA
- PT Elsewedy Electric Indonesia
- GI 150 kV KTT Data Center Cikarang

FOTO LAPORAN HARIAN / DAILY REPORT PHOTOS



Safety Briefing

Safety Briefing



Site Test

Site Test



Pengambilan Sampel Oli DGA

Pengambilan Sampel Oli DGA



PT SANDIKA KURNIA PERMATA

Proyek / Project

Langganan / Client

Lokasi / Location



: Instalasi dan Site Test Trafo 60 MVA

: PT Elsewedy Electric Indonesia

: GI 150 kV KTT Data Center Cikarang



Touch Up



Touch Up



Touch Up



Touch Up
